


## EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Travaux d'élargissement de la rue du Tramway à ESCHAU : démolition et reconstruction du pont sur le Canal du Rhône au Rhin


### **DOSSIER D'EXPLOITATION**

1) Plan de situation: projet

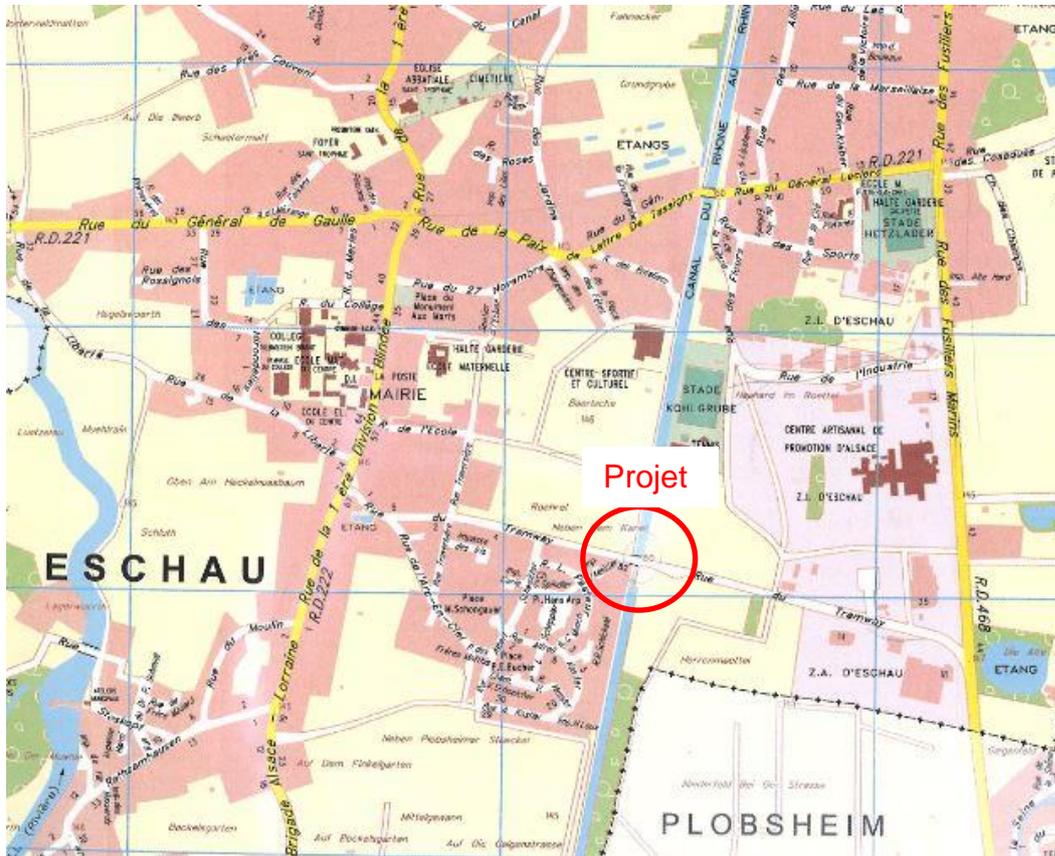


2) **Description des travaux:**

L'opération consiste à démolir et reconstruire le pont sur le Canal du Rhône au Rhin. Le nouveau pont aura une longueur de 26.40m et une largeur de 10.75m comprenant une voie verte de 3.50m, une chaussée de 6.25m et un chasse-roue de 1.00m

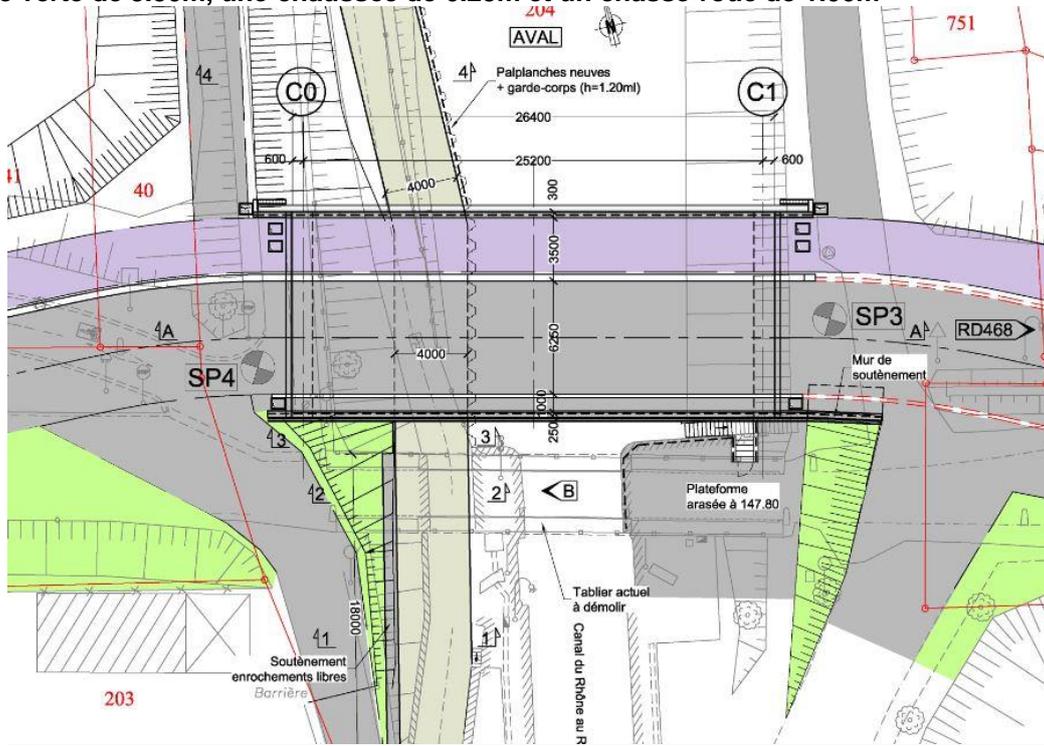


Et la création d'une voie verte sur la rue du Tramway de la rue de l'Artisanat à la voie verte existante à l'Ouest du pont.

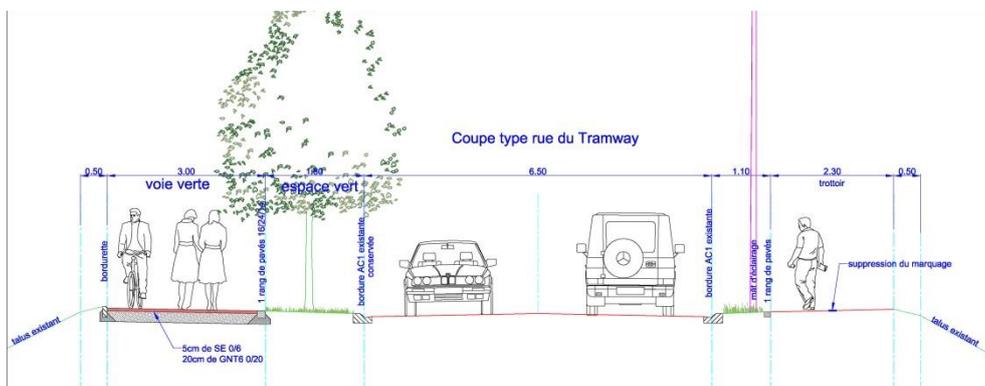


**3) Planning des Travaux :**

**-PHASE 1 : de novembre 2021 à avril 2022 - construction de l'ouvrage futur.  
(Circulation rue du Tramway conservée et déviation des cyclistes qui circulent le long du Canal)**

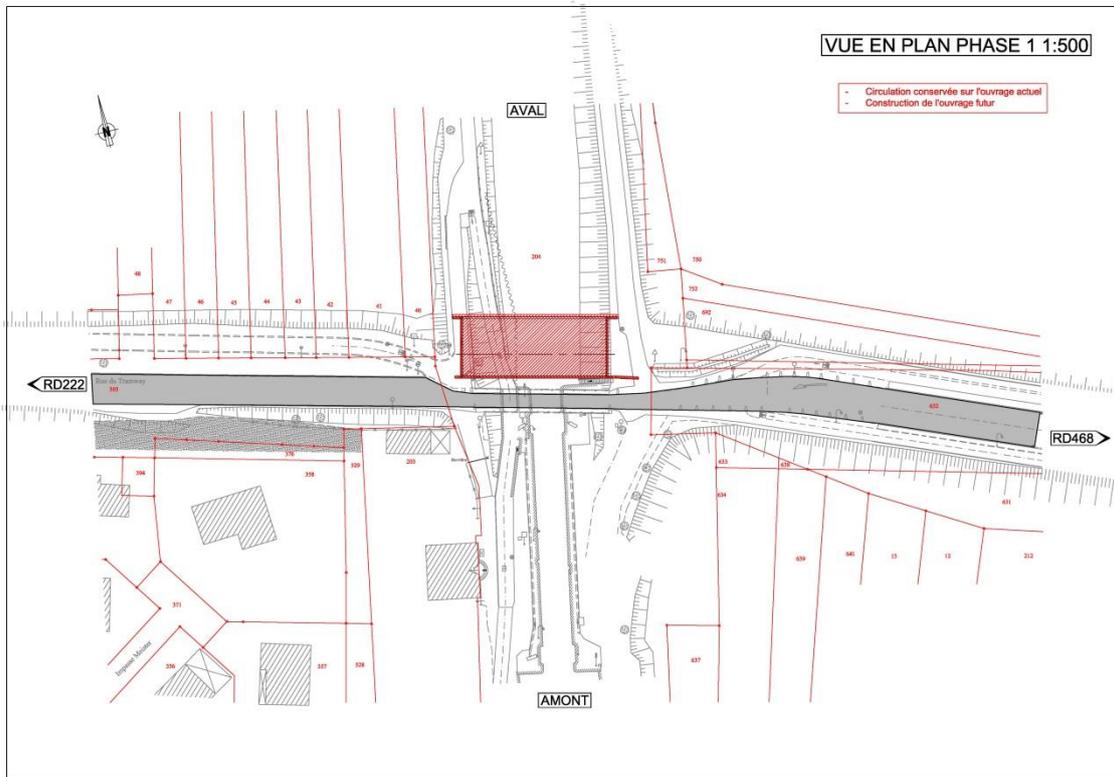

**-PHASE 2 : avril 2022 - démolition de l'ouvrage existant (rue du Tramway barrée)**

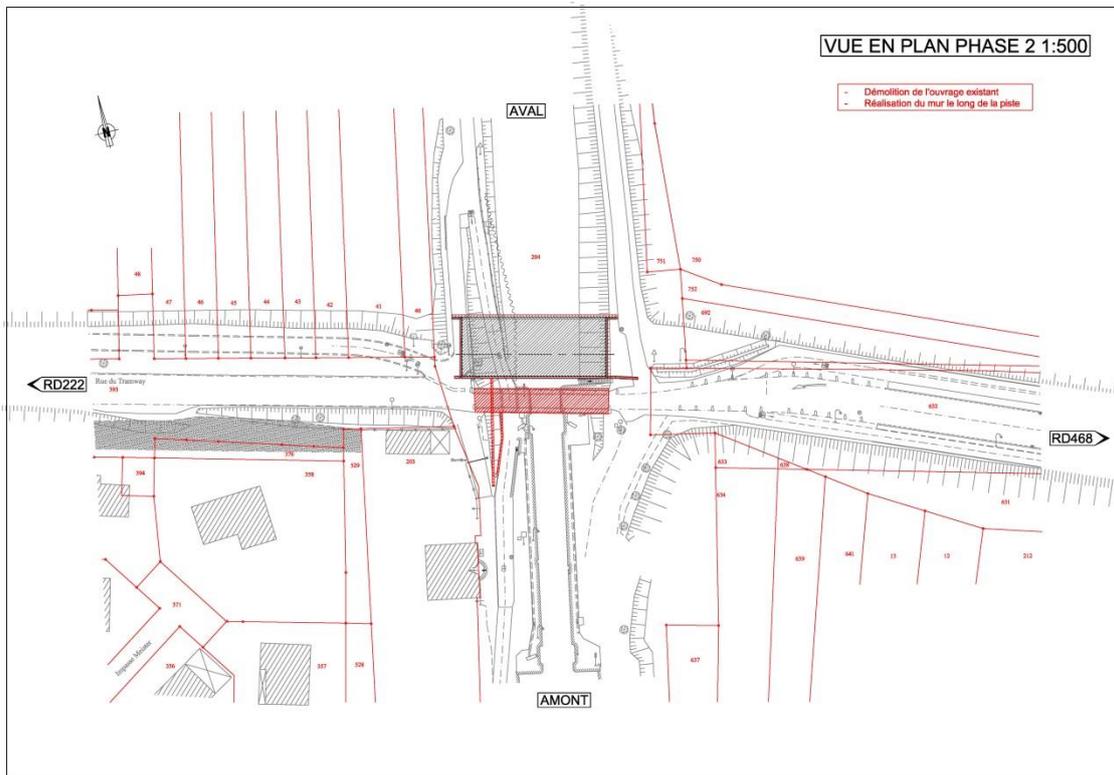



## Plan de déviation pour rue du Tramway barrée du 11 avril 2022 au 30 juin 2022

### Déviation –piétons et cyclistes



## Déviation VL et PL



### Signalisation :

La déviation des cyclistes a été mise en place par l'entreprise TH Signalisation.

Panneaux en place depuis novembre 2021.



Panneaux pour barrer la piste à l'amont du pont



Panneaux pour barrer la piste à l'aval du pont



Panneaux qui seront mis en place par l'entreprise TH 15 jour avant la déviation :



### 5) Sécurité:

Le chantier est soumis aux obligations suivantes:

- Coordination Sécurité et Protection de la santé
- Plan général de la Coordination
- Plans de prévention et de Sécurité de Protection de la Santé
- Protocole spécifique de reprise « COVID 19 » établie par l'entreprise

La coordination SPS est assuré par la société "PRESENTS" représenté par M. François SCHAHL

**6) Information:**

Préalablement à ces travaux il sera procédé à une information générale préalable.

- Le dossier d'exploitation
- L'information des riverains rédigée et distribuée par le maître d'ouvrage.

**7) Mise en place de la signalisation de chantier et maintenance:**

La mise en place et l'entretien de la signalisation de chantier est à la charge de l'entreprise titulaire du marché.

**8) Coordonnées:**

**Maître d'œuvre :**

BET FAVIER-VERNE  
Monsieur Gilles FAVIER  
9, route de Hurtigheim  
67117 QUATZENHEIM  
Tél : 03 88 64 48 90  
Portable : 06 72 93 10 44

**Maître d'Ouvrage:**

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG  
Direction des Projets sur l'Espace Public  
Mme Nathalie URBANO DEL REY  
Tel: 03 68 98 66 87  
Portable : 06 19 69 76 25

**SPS : St Présents :**

François SCHAHL  
7 rue de Dublin - Schiltigheim  
BP 40049  
67014 Strasbourg Cedex  
Tel : 03 90 22 31 41 – 06.26.28.96.52

**Entreprise SAERT:**

13 rue de l'EUROPE  
67230 BENFELD  
Alain BALDINGER : 06 87 84 83 33  
Théo BALDINGER : 06 07 18 64 91
